HUG the People 국민을 품겠습니다

제 안 요 청 서

사 업 명	디지털 혁신을 위한 차세대 정보시스템 구축 사업 감리 및 개인정보 영향평가 용역
주관기관	주택도시보증공사

2024. 05.

사 업 담당자	팀 장	고 성 호	TEL : 02-3771-6291
	차 장	최 준 오	TEL : 02-3771-6293

목 차

Ⅰ. **사업 개요** · · ·

서식자료

[붙임 1호 서식] 일반현황 및 연혁 ····· 50
[붙임 2호 서식] 재무현황(최근 3년) ····· 51
[붙임 3호 서식] 사업추진 조직도 ····· 52
[붙임 4호 서식] 참여인력 요약 ····· 53
[붙임 5호 서식] 참여인력 이력사항 ····· 54
[붙임 6호 서식] 비상근 감리원 참여동의서 ····· 55
[붙임 7호 서식] 외부 용역사업 보안특약 ····· 56
[붙임 8호 서식] 수급업체 안전보건수준평가 자가평가표 ····· 68

Ⅰ 사업 개요

1 개요

□ (**사 업 명**)「디지털 혁신을 위한 차세대 정보시스템 구축 사업」감리 및 개인정보 영향평가 용역 사업

□ (**사업 기간**) 계약체결일로부터 24개월

※ 사업기간은 대상사업의 계약종료 일정에 따라 변경, 조정될 수 있음

□ (**사업 예산**) : 2,415,766,660원(VAT포함)

o (**감리용역**) 2,059,000,599원

o (**개인정보 영향평가**) 356,766,000원

□ (**계약 방법**) 일반경쟁입찰 - 협상에 의한 계약 체결

※「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)」적용

2 추진배경 및 필요성

□ **(정보시스템 품질 제고)**「디지털 혁신을 위한 차세대 정보시스템 구축」(이하 '대상 사업') 추진 과정 및 단계별 과업의 적정성과 이행 여부를 점검하고 문제점 개선

□ **(개인정보 보호)** 정보시스템 구축·운영에 따른 개인정보 침해요인 분석 및 개선방안 적용을 통한 개인정보 침해사고를 예방

□ **(법령 준수)** 대상 사업은 전자정부법 및 개인정보보호법에 의거, 전문기관의 감리 및 개인정보영향평가 의무 수행 대상

Ⅱ 감리 대상 사업

1 대상 사업 개요

□ **(사 업 명)** 「디지털 혁신을 위한 차세대 정보시스템 구축사업」

□ **(사업 기간)** 계약체결일로부터 30개월(안정화 6개월 포함)

□ **(사업 예산)** 69,846,841,000원 (VAT 포함)
※ 직접구매 S/W 구매 비용(6,734,041,000원) 미포함

□ **(계약 방법)** 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약 체결)

2 사업 목적

□ **(복잡도, 노후화)** 지속적인 공사의 업무 확대 및 상품 다양화로 인한 시스템 복잡도를 증가시키는 유사·중복 기능이 다수 존재하고 시스템 노후화로 내용연수가 만료된 정보시스템이 다수 존재

□ **(변화 대응)** 급변하는 정부 정책 및 ICT 기술 발전에 대응할 수 있는 미래 지향적 정보시스템 필요

□ **(비대면서비스)** 비대면서비스를 이용하는 고객의 지속적인 증가로 보증 서비스를 원활히 제공할 수 있도록 보증신청 및 서비스(인증, 결제 등)의 개선이 필요

□ **(IT서비스 품질)** 신속하고 효율적인 IT 서비스 제공을 위하여 IT 프로세스·규정·관리시스템 등의 개선 필요

□ **(의사결정 지원)** 경영진의 의사결정 지원을 위하여 신속하고 정확한 통계정보를 집중적으로 제공하는 데이터 분석시스템 구축 필요

3 사업범위

□ 목표시스템 구성도

□ 사업 대상 시스템

업무영역	시스템	구분
채널영역	공사 홈페이지	구축
	주택정보포털	구축
	인터넷보증	구축
	전자입찰	플랫폼변경
	HUG-i	구축
	안심전세(모바일보증)	구축
	안심전세포털	대응개발
	도시재생포털	대응개발

계정계 영역	차세대시스템	구축
기금영역	기금관리시스템(HUF-Net)	대응개발
	도시재생융자시스템	대응개발
정보계 영역	EDW	구축
	구분회계	구축
	통합감사	구축
	전사리스크관리	대응개발
	기금리스크관리	대응개발
	빅데이터플랫폼	대응개발
	IFRS17 결산체계	대응개발
업무지원 영역	업무포털	구축
	홈페이지컨텐츠관리	구축
	그룹웨어	대응개발
	SmartHR(인사/급여)	대응개발
	콜센터	대응개발
	내부회계	플랫폼변경
	사규관리	플랫폼변경
	국회업무관리시스템	플랫폼변경
IT관리 영역	데이터품질관리	구축
	메타관리	구축
	IT서비스관리	구축
	영향도분석	구축
	형상관리	구축
대외계	대외연계시스템	구축

□ Post 차세대시스템 구축 사업은 10개 그룹, 48개 세부과제로 정의함

그룹	순번	과제명	주요 내용
채널	1	**홈페이지 구축**	공사 대국민 채널(홈페이지, 주택정보포털, HUG-i 등)을 기능별 통폐합·고도화
	2	**비대면업무채널 구축**	공사 보증 서비스를 위한 대국민 채널 (인터넷보증/모바일보증 등) 재구축
보증	3	**Paperless 체계 구축**	제출서류 외부기관 연계 강화 및 영업부서 디지털창구 도입을 통한 Paperless 체계 구축
	4	**보증공통시스템 구축**	보증업무를 처리하기 위한 고객, 상품, 신용카드, 주소, 기일, 사업장, 시스템 결재, 인터넷보증 등 공통 정보를 통합 관리하는 시스템 구축
	5	**보증시스템 구축**	보증 신청, 발급, 해지, 사후관리, 보증이행, 전자보증 등 보증 업무 일련에 대한 시스템 구축
	6	**다이렉트 보증시스템 구축**	가입 조건을 만족하는 보증 신청건에 대한 심사 자동화를 통해 다이렉트 보증서비스 구축
	7	**전자보증시스템 구축**	하도급대금지급보증 전자보증시스템 구축
	8	**디지털등기관리 시스템 구축**	등기 관련 업무 전자화, 자동화 및 인터넷 등기소 연계 등기관리 시스템 구축
	9	**채권관리시스템 구축**	채권관리를 위한 소송, 채무자이수관 관리, 법적 조치, 채무재조정, 채무상환/예수금, 시효관리, 특수채권 등 업무 처리할 수 있는 시스템 재구축 및 전세피해지원시스템 (피해확인서 신청, 전세 사기분석, 경공매 지원 등) 구축
	10	**미분양매입/편입시스템 데이터 이관**	미분양매입/편입 시스템 데이터 이관 (시스템 개발은 사업범위 제외)
	11	**융자수탁시스템 구축**	대하관리, 융자관리, 조건변경/이수관관리 등 융자수탁업무 처리를 위한 시스템 재구축
	12	**융자시스템 구축**	융자금관리, 융자금출금이체관리 등 융자업무처리를 위한 시스템 재구축
	13	**UX컨설팅**	보증, 회계 화면을 대상으로 집중개선대상을 선정하여 UI/UX 개선을 추진하고, 사용자 중심의 UI/UX 표준을 수립하여 개발 및 유지보수 시의 일관된 UI/UX를 제공

그룹	순번	과제명	주요 내용
업무지원	14	**업무포털시스템 구축**	응용시스템 접근에 대한 단일 접점을 제공하고, Post 차세대시스템 사용자 업무 특성별 포털 서비스를 구축하며, 보증, 기금, 업무지원, 정보계의 특정 업무 처리 알림서비스 구축, 주요 지표정보 또는 업무정보에 대한 연동처리를 수행
	15	**SSO 및 권한관리시스템 구축**	응용시스템과 연계한 SSO(Single Sign On) 로그인 처리, Two-Factor인증, 역할, 역할별 접근권한, 메뉴관리를 할 수 있는 시스템 구축
	16	**홈페이지 콘텐츠관리 시스템 구축**	홈페이지 콘텐츠 등록 관리, 템플릿 관리 및 배포등록까지 콘텐츠 라이프사이클을 관리할 수 있는 시스템 구축
	17	**예산관리시스템 구축**	예산편성, 예산배정, 예산집행, 예산현황 및 예산성과금관리 등 예산관리 라이프 사이클에 대한 종합적인 업무처리 시스템 구축
	18	**자금관리시스템 구축**	차입금, 예금, 유가증권, 자금집행, 자금경보, 주주/주식 관리 등 자금을 관리하는 시스템 구축
	19	**자산관리시스템 구축**	자산대장, 자산이수관, 자산변동, 감가상각, 사옥, 비품, 보험, 비금융, 계약, 도서, 우편물 등 관리할 수 있는 시스템 구축
	20	**회계시스템 구축**	지출관리, 전표관리, 결산관리, 세무관리, IFRS 결산부속명세관리 등 회계업무처리시스템 구축
	21	**구분회계시스템 구축**	회계정보 대사, 데이터 검증, 기준정보관리, 책임회계, 성과분석 등 구분회계 관련 업무수행을 위한 시스템 구축
	22	**매입임대시스템 구축**	매입물건 관리, 입주자 모집관리, 임대주택 계약관리, 사후관리 등 매입임대 관련 업무수행을 위한 시스템 구축
기금	23	**임대리츠시스템 구축**	출자변경신청관리, 사업장 및 모리츠사후관리, 위탁수수료 등 임대리츠업무처리를 위한 시스템 재구축
	24	**AMC시스템 이관**	AMC(자산관리회사) 관련 시스템 이관
	25	**기금 데이터베이스 이전**	차세대와 같은 데이터베이스를 이용하고 있는 기금 데이터들을 기금 데이터베이스로 이전

그룹	순번	과제명	주요 내용
인터페이스	26	**보증FEP 구축**	대외시스템의 전문을 통합관리하고, 대량처리가 가능한 FEP 솔루션을 도입하여 다양한 채널 연계방식을 표준화하여 재구축
	27	**대내 EAI/ETL 구축**	시스템 간의 연계방식을 통합적으로 관리할 수 있는 통합연계솔루션(EAI/ETL)을 도입하여 재구축
IT 관리	28	**데이터품질관리시스템 구축**	업무규칙(BR) 정립 및 등록을 통해 정기적으로 데이터품질을 점검, 다양한 품질측정지표를 관리, 품질활동에 대한 종합적 통계정보를 제공을 통해 데이터품질관리 선순환 체계 구축
	29	**메타관리시스템 구축**	단어, 용어, 도메인, 코드, 데이터 타입, 연계전문용어, 응용프로그램 용어 등 전사 데이터 자산을 표준화 및 정비하고, 테이블 생성 및 통합코드배포, 메타데이터 관리 시스템과 관련 시스템 간 연계, 메타데이터관리 체계를 구축
	30	**ITSM/ITAM 구축**	IT관리 프로세스를 개선, 관련된 시스템(형상관리, 메타관리, 데이터품질, 영향도분석, 권한관리 등)과 연계를 강화, IT자산관리 기능 도입, 개발방법론, 개발산출물, 개발표준을 통합관리하는 시스템 구축
	31	**영향도분석시스템 구축**	화면, 소스코드, 테이블 정보를 기반으로 모델변경영향도분석, 소스추적, 코드품질측정, 변경영향평가 및 측정 체계 구축
	32	**형상/배포관리시스템 구축**	형상자원에 대한 변경 이력관리, 버전관리, 추적관리 및 스케쥴배포, 실시간 모니터링, 다양한 빌드 스케줄링 수행 기능 구축
정보계	33	**Data-Lake 기반 정보계 구축**	보증과 회계 영역의 데이터를 Data-Lake 기반으로 정보계에 통합하여 빅데이터 통합분석체계를 마련하고, 현업에서 비즈니스 분석을 용이하게 활용할 수 있는 기반을 구축
	34	**통합감사시스템 구축**	감사계획, 일상감사, 민원/사고, 방만경영 등 감사업무를 수행하고, 사후관리를 수행하는 시스템 구축
	35	**상시모니터링시스템 구축**	고객정보를 모니터링하고, 상시모니터링 점검대상, 판정내역, 등급내역을 관리하는 시스템 구축

그룹	순번	과제명	주요 내용
대응 개발	36	안심전세포털 대응개발	차세대 시스템 재구축에 따른 안심전세포털 관련 연계정보 대응개발
	37	콜센터 대응개발	공사 콜센터시스템 연계정보 대응개발
	38	SmartHR대응개발	보증시스템, AMC, 회계시스템 SSO/권한관리시스템에 조직도/사용자 정보 수동 및 자동 연계 기능 대응개발
	39	IFRS17 대응개발	보증공통, 보증, 회계 시스템 재구축에 따른 연계정보대응개발
	40	경영지원 시스템 플랫폼 변경	사규관리시스템, 내부회계시스템, 국회업무관리시스템을 Private 클라우드 자원으로 이관
	41	도시재생융자시스템 대응개발	도시재생융자시스템에서 수행하던 보증업무를 보증공통, 보증시스템에서 통합관리함으로 업무처리에 필요한 연계정보 대응개발
	42	주택도시기금영역 대응개발	차세대 데이터베이스 구조 및 값 변경에 따른 기금 프로그램 대응개발
	43	전사리스크관리시스템 대응개발	전사리스크연계 대상정보를 기존 차세대업무시스템에서 정보계영역 BI/Datalake대상으로 연계정보 대응개발
	44	HUG빅데이터플랫폼 대응개발	빅데이터 연계 대상 정보를 BI/Datalake로 변경 등 대응개발 수행
IT 환경	45	Cloud기반 인프라 구축	업무 그룹별로 네트워크를 분리하고, 노후화된 인프라를 Private Cloud기반으로 재구축하여 통합관리 및 모니터링 체계를 구축
	46	개발, 테스트, DR 통합환경구축	Cloud기반으로 DR센터에 개발계, 테스트계, DR계를 망구분하여 구축
	47	개발방법론 정립 및 실시간 산출물 현행화 체계 구축	Post 차세대시스템 구축 사업의 방법론을 기반으로 공사의 Web개발, OOP개발, 패키지개발, 빅데이터개발, 아키텍처, 사업관리 방법론을 정립하고, UI도구, 권한관리시스템, 메타데이터, 배치 Scheduler, EAI, ETL, CDC, FEP/EIMS에서 실시간 산출물 추출 체계를 구축
보안	48	개인정보영향평가 반영	별도 사업으로 진행할 개인정보영향평가 결과 반영

4 추진체계

□ 사업 추진 조직도

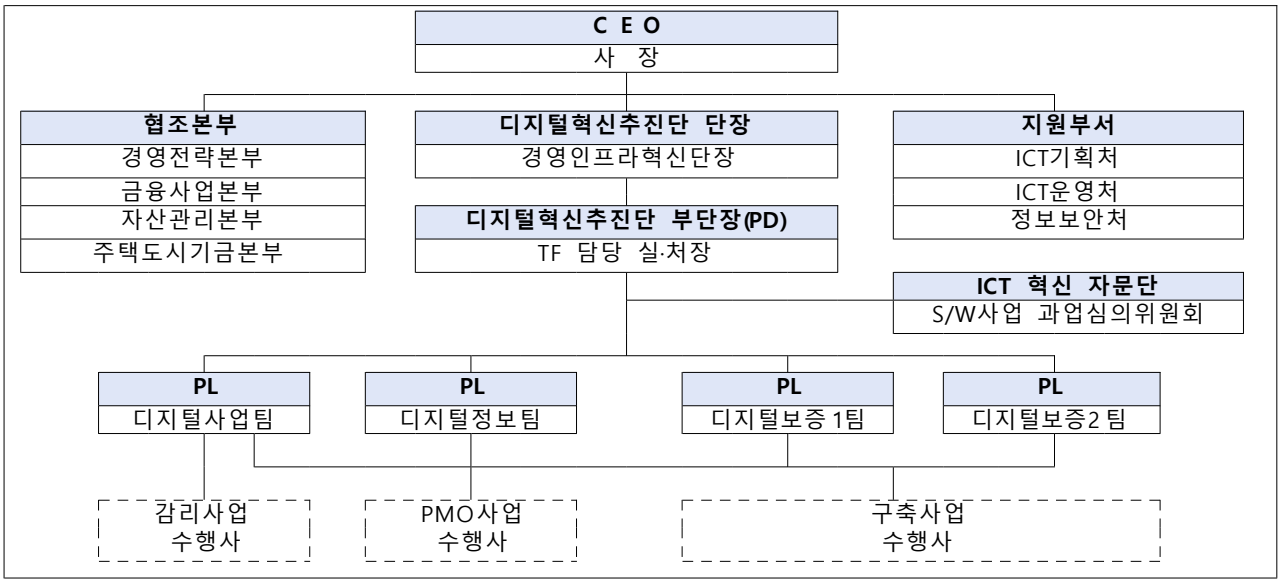

□ 역할

구 분	역 할	구 성
사 장	공사 업무 총괄	사 장
단 장	디지털혁신추진단TF 업무 총괄	경영인프라혁신단장
부단장	단장으로부터 위임받은 사항의 의사결정	TF담당 실·처장
디지털사업팀	사업관리, ICT 아키텍처 구성 등	디지털사업팀장
디지털정보팀	담당 업무시스템 분석·설계 등	디지털정보팀장
디지털보증1팀		디지털보증1팀장
디지털보증2팀		디지털보증2팀장
구축사업 수행사	구축사업 수행	-
PMO 수행사	사업관리(PMO) 수행	-
감리 수행사	감리 및 개인정보영향평가 수행	-

5 추진일정

□ 계약체결일로부터 30개월(안정화 6개월 포함)

※ 상기일정 및 업무구분은 변경될 수 있음

6 기대효과

□ 고객 중심 디지털플랫폼 구현

- ㅇ 정책변경에 신속하게 대응하고 고객의 정보탐색 및 시인성, 보증신청 편의성을 제고하며 민원처리에 대한 통합관리 및 일관된 대응 가능

□ 업무혁신을 통한 IT시스템 진화

- ㅇ 이용자 제출서류 간소화 전자문서화로 이용자 편의성을 증대하고 화면·데이터 통합 정비 및 프로세스 혁신을 통한 업무처리 효율화 제고

□ 데이터 기반 과학적 의사결정체계 구축

ㅇ 전사 표준화 및 체계적인 데이터 관리를 통해 고품질의 데이터를 확보하고 Data-Lake, AI기반 분석플랫폼 제공으로 현업의 데이터 분석능력 향상과 분석 데이터의 업무 활용성 증대

□ 디지털 역량 강화를 통한 신속한 IT서비스 제공

ㅇ 정보화 기획·개발·운영·평가의 선순환 IT 프로세스 적용으로 IT 운영 효율성 및 IT 서비스 품질을 향상하고 IT 자산을 통합 관리하여 IT 자산관리 효율화 제고

□ 탄력적이고 안정적인 IT인프라 조성

ㅇ 대외계 연계서비스의 이원화로 연계회선의 생존성을 향상하고, 노후된 인프라를 클라우드 기반 환경으로 전환하여 탄력적이고 안정적인 IT 인프라 구현

Ⅲ 공사 업무 및 정보화 현황

1 공사 업무 현황

가. 일반현황

설립근거	「주택도시기금법」	설립년월	1993.04
설립목적	주거복지 증진과 도시재생 활성화를 지원하기 위한 각종 보증업무 및 정책사업 수행과 주택도시기금을 효율적으로 운용·관리함으로써 국민의 삶의 질 향상에 이바지함 (「주택도시기금법」 제1조 및 제16조)		
주요 연혁	• 1993 주택사업공제조합 설립 • 1999 대한주택보증주식회사 전환 설립 • 2007 **차세대시스템, 그룹웨어 구축** • 2012 개인보증시스템, 인터넷보증시스템 구축 • 2013 정부정책보증시스템, 리스크관리시스템 구축 • 2015 주택도시보증공사 출범, 주택도시기금관리시스템 구축 • 2016 중장기 정보화전략계획(ISP) 수립 • 2018 Smart-HR(인사급여) 시스템 구축 • 2019 기금대출심사 통합시스템, 도시재생융자시스템 구축 • 2021 IFRS17 결산 시스템 구축('21 ~ '23) • 2022 **Post 차세대시스템 구축 사전컨설팅 수행 ('22.02 ~ '22.07)** • 2023 **디지털 혁신을 위한 업무 재설계(BPR) 수행 ('23.09 ~ '24.05)**		

나. 주요업무

□ 공사의 주요업무로는 보증, 보증이행, 채권관리, 신용평가, 기금업무 등이 있음

- ㅇ (**보증업무**) 분양보증, PF보증, 전세보증 등 기업 및 개인 보증상품 운영
- ㅇ (**보증이행**) 보증사고 발생 시 분양이행 또는 이미 납부한 중도금 환급이행
- ㅇ (**채권관리**) 주채무자 채무 불이행 시 채권의 회수
- ㅇ (**신용평가**) 보증 거래고객의 재무상태 및 경영능력에 대한 신용평가 업무
- ㅇ (**기금업무**)「주택도시기금법」에 따른 기금의 운용 · 관리에 관한 업무

2 공사 정보화 현황

□ 현행 업무시스템 현황

□ 차세대업무시스템(계정계 영역) 주요기능

업무구분	주요 기능
고객관리	고객등록/변경, 고객현황, 고객신용, 이수관, 합병/분할/채무양수, 고객의소리(VOC), 우수고객, 본점관리, 정보공개창구, 사회임대주택, 일자리창출, 방문예약
선진형신용평가	신청, 평가, 결과, 본점관리
융자	융자금, 융자금출금이체, 본점관리
사업장관리	기본정보, 사후관리, 분양대금, PF사후관리, 조회/출력, 본부관리, 사전설명제, 공사후매각, 공유형모기지정산
보증/상품	보증상담, 예비심사평가, 사업장관리, 보증신청, 보증심사, 보증승인, 보증채무약정, 담보, 보증서발급, 보증사후관리, 기일관리, 본부관리, 후분양/모기지, 위탁보증, 상품관리
인터넷보증	고객관리, 보증관리, 조회/출력, 기업보증, 개인보증, 재기지원, 모바일보증

업무구분	주요 기능
개인보증	고객정보, 집단보증취급, 보증신청승인, 보증채무약정, 담보, 보증서발급/해지, 보증사후관리, 사업장관리, 보증이행, 구상채권, 공통업무, 본부관리, 임차료지급보증
서민주거안정보증	보증상담, 보증신청승인, 보증채무약정, 담보, 보증서발급/해지, 보증사후, 포괄약정보증, 임대관리보증사후관리, 보증이행, 공통업무, 모바일보증, 안심전세진단
융자수탁 및 통합채권관리	대하관리, 채무자이수관/관리업무, 법적조치, 채무재조정(회생 등), 채무상환/예수금, 미분양/환급사업장, 시효관리, 특수채권, 공통조회
임대리츠	임대리츠기본정보, 출자신청승인, 출자/배당, 사후관리, 위탁수수료, 조회/출력, 임대리츠PF보증, 리츠회사채보증, 공통관리
AMC	리츠기본정보, 출자실행, 사후관리
미분양매입/편입	매입신청관리, 본심사관리, 승인관리, 매입계약, 사후관리, 조회/출력, 자금운용수익율관리, 편입신청, 편입심사, 편입승인, 편입계약, 사후관리
신용카드	기본정보, 승인청구매입
사업성분석	사업성분석, 사업성분석 출력
보증이행	보증사고, 분양보증이행, 임대사업장, 하자보증이행, 기타보증이행, 담보, 결산부속명세서, 본부관리, 입찰, 전세상품보증이행조회, 사업장안전점검
회계	지출, 전표, 결산, 세무, IFRS결산부속명세, 회계정보, 보증계약_사업비, 구상채권평가, 금융상품평가, 공시
자산	자산대장, 자산이수관, 자산변동, 감가상각, 사옥, 비품, 보험, 비금융, 계약, 도서, 우편물
투자자산	투자자산손상차손, 투자자산이수관, 투자자산매각, 조회/출력, 비금융
자금	차입금, 예금, 유가증권, 자금집행, 자금경보
예산	예산편성, 예산배정, 예산현황, 예산성과금
주주/주식	주총, 주주, 주식, 주식명세서, 증감자 및 배당금
상시모니터링	고객상시모니터링, 고객공통정보조회, 통계정보, 본점관리
성과관리(BSC)	내부평가, 정부경영평가, 시스템관리
공통	시스템관리자, 전산관리, 일반사용자메뉴, 정보보안

□ 인터넷보증(채널영역) 주요기능

업무구분	주요 기능
고객정보	My정보, 보증현황, 사업장현황, 업무거래등록정보변경, 신용카드이용신청, 신용평가, 융자, 채무자권리헌장, 보증중복가입확인, 부조리신고(헬프라인)안내,
신용평가	신용평가신청안내, 신용평가신청, 신용평가결과
임차권등기명령 대위신청	임차권등기대위신청, 임차권등기대위신청내역조회
신청	보증신청, 신청내역조회, 보증신청가능여부확인, 미환불보증료환불신청, 미환불보증료환불신청내역조회
약정	한도거래약정신청, 한도거래채무약정, 보증약정조회, 약정내역조회
자료제출	사전설명제자료제출, 재무제표온라인제출, 분양관리자료제출, 임대관리임대료보증, 현금흐름표자료제출, 보증이행서류제출, 이행방법선택권, 환급이행상담
발급/재발급	보증료납부, 보증서발급, 보증서재발급, 현금담보, 담보대용료
변경	기재사항변경, 기간연장, 보증증액, 보증감액, 신청내역조회, 조합원변경
채무자 지원	채무자 지원, 상환약정, 채무조회, 상환 등
채권관리 업무 수탁	채권관리 업무(재산조사, 채권보전조치 등) 수탁업무 결과물 등록, 비용청구, 업무연락 등
해지/취소	보증해지, 보증취소, 신청내역조회
보증이행청구	보증이행안내, 보증이행청구신청, 이행청구내역조회, 입주불가사실확인서신청
제증명발급	영수증출력, 금융거래확인원, 주주증명(원), 납입증명서출력

□ 현행 정보 인프라 현황

※ 시스템 구성도 및 상세자료 등은 보안상의 이유로 제안서 작성기간 중 희망자에 한하여 열람 가능

Ⅳ 제안요청 내용

1 감리

가. 주요 과업 내용

ㅎ 착수계 및 감리계획서 작성 · 제출

o 감리법인은 단계별 감리수행 전에 감리일정, 인력 편성, 감리범위 및 점검항목 등을 명시한 착수계 및 감리계획서를 발주자와 사업자 등에게 제출하여야 함

※ 계약체결 후 10일 이내 감리계획서 제출하여야 하며, 발주자의 승인을 받아야 함

※ 감리계획서는 발주자 및 감리대상사업자에게 제출하여야 함

- 감리 일정 및 점검항목, 사업에 예상되는 주요 이슈와 위험요소들을 도출하고, 증거자료와 관리방안을 제시하여야 함
- 과업이행여부, 기술적용계획표 등 필수점검사항에 대한 점검방법을 구체적으로 제시하여야 함

ㅈ 예비조사, 감리계획 수립 및 통보

o 감리법인은 예비조사를 실시하여 해당 과제의 단계별 감리계획서를 「정보시스템 감리수행 가이드」의 해당 서식을 참조하여 작성, 감리 착수 전에 제출하여야 함

- 감리법인은 감리계획서, 착수회의, 감리수행, 종료회의, 시정조치계획, 조치이행여부 확인 등 감리용역 수행에 필요한 모든 보고서(산출물)를 제출하여야 함

※ 감리계획서는 발주자 및 감리대상사업자에게 제출하여야 함

- 예비조사와 현장감리의 일정은 중복되지 않아야 함
- 예비조사에 참여하는 인력은 감리일정계획에 표시하여야 함

o 단계별 감리 시 이전단계 감리지적사항에 대한 시정조치결과가 조치 중이거나 미반영 사항이 있을 경우 이를 확인하여 감리대상 항목에 포함하여야 함

감리수행

o 감리수행은 단계 감리 4회(요구정의, 설계, 개발, 종료단계) 이상, 회당 10일 이상 수행하여야 함

- 정기감리(현장감리) 실시 이전에 참여 감리원이 사전감리 검토를 현장에서 수행하며, 사전감리 일정을 수립하여 감리 추진계획 및 주요 점검사항을 피감리기관(사업자)에 자료로 제출하여야 함
- 개발단계 감리는 단위테스트 위주로 수행하고, 통합테스트 진입 가능 여부를 제시
- 예비조사, 시정조치확인 등을 제외한 단계감리의 순수 현장감리에 소요될 최소감리기간(주말 및 공휴일 제외)은 대상사업비를 근거로 하여 적정한 수준의 투입공수를 제시할 것

대상 사업비	10억 미만	10억 이상 20억 미만	20억 이상 30억 미만	30억 이상 50억 미만	50억 이상 100억 미만	100억 이상
최소 감리기간	5일	6일	7일	8일	9일	10일

※「정보시스템 감리기준」제4조(감리대가 산정)의 별표1에 따른 "감리대상사업비 보정금액"을 의미하며, 감리대상사업의 사업자가 추가로 제안하여 개발되는 내용도 감리대상에 포함하여 수행하여야 함

※ 정보시스템 구축/운영 감리경험이 있는 감리인 3명 이상을 투입하여야 함

※ 데이터베이스 품질관리 또는 품질점검 감리 경험이 있는 감리인 1명 이상 투입하여야 함

※ 업무의 연속성을 고려하여 설계, 종료단계 감리에 동일한 감리원 투입하여야 함

o 감리원 편성

- 감리원 배치 : 총괄 감리원, 감리원 및 비상주 감리원 등

※ 가용예산과 적정인력 범위 내에서 상주감리 또는 추가감리 제안이 가능함

※ 상시/상주감리를 계획하는 경우, 투입공수와 수행업무를 명확히 기재하되, 일상적인 사전조사나 감리결과 조치 확인은 이에 해당하지 않음

※ 보조 인력은 감리 참여인력으로 인정하지 않음

- 참여 감리원은 총괄감리원을 포함하여 해당 감리법인(공동수급으로 제안하는 경우 공동수급체)의 상근 감리원이 2분의 1이상이어야 함

- 비상근 감리원은 제안 시 비상근 감리원 참여 동의서를 제출하여야 함

o 자격기준

- 총괄감리원은 해당 감리법인의 상근 감리원 중 실제 감리에 투입된 기간이 1년 이상인 수석감리원으로서 적절한 능력과 경험이 있는 자로 투입하여야 함

- 참여감리원은 행정안전부에 등록된 감리원 또는 수석감리원이어야 함

- 기능 테스트는 테스팅 전문 인력을 투입

감리 착수회의 개최

o 감리법인은 사업주관부서, 피감리기관(사업자), 감리원 및 기타 관련 당사자들이 참석하는 착수회의를 개최하여야 함

- 투입 감리원, 감리일정 소개, 감리 중점 검토사항에 대한 설명 및 피감리기관(사업자), 주관부서와의 협의, 조정 등의 업무 수행

현장감리 실시

o 현장 감리기간 동안 모든 감리원은 업무 일과시간의 100%를 상주하면서 관련 산출물 검토 및 담당자 면담 등의 활동을 수행하여야 함

- 감리원(전문가 포함)의 투입에 대한 사항은 피감리기관(사업자)과 동일한 작업장소에서 상주 근무하여야 하며, 감리업무일지를 작성하여 제출

※ 상주감리를 추가 계획하는 경우, 투입공수와 수행업무를 명확히 기재하되, 일상적인 사전조사나 감리결과 조치 확인은 이에 해당하지 않음

o 감리법인은 확보된 감리장소에서 전문가적 주의를 다하여 관련 산출물, 시스템 등을 검토하고, 주관기관 및 피감리기관(사업자)의 담당자를 면담하여 개선해야 할 문제점을 파악하고 개선방향을 마련하여야 함

- 타기관과의 연계, 여신심사 및 개인정보보안 등 관련 전문성과 감리 경험이 많은 감리원의 투입을 권고함

o 감리법인은 현장 감리 기간 중에 발견한 특이사항 및 문제점에 대하여 증거자료 등과 함께 누락 없이 기술하여 감리보고서 초안을 작성하여야 함

o 발주기관은 현장 감리기간 중 감리법인의 감리현장에 대해 사전통보 없이 실사를 통보할 수 있음

- 제안서 및 감리계획서에서 명시한 감리원의 편성 준수성
- 상근 및 비상근 감리원의 근태
- 감리원의 금전적 또는 기타 부당한 요구 여부 등

※ 발주기관의 현장실사 시 인력 투입사항이 감리업무 일지와 상이한 경우에는 해당 인력의 감리비를 삭감하고 향 후 일정기간 입찰참가를 제한 받을 수 있음

ᵝ 감리보고서(감리수행결과보고서) 작성

o 감리법인은 현장 감리 기간 중에 감리보고서 초안을 작성하여야 함

- 개선권고사항은 근거 및 논리가 명확하여야 하며, 전문가적 주의를 다하여 발견한 사항을 누락 없이 기재하여야 함
- 감리보고서 제출 시 사업관리(진척관리, 위험관리, 변경관리(인력/범위), 품질관리) 각 영역에 대한 감리의견(세부항목별 의견 포함)을 반드시 제시하여야 함
- 감리보고서의 작성 기준 및 양식은「정보시스템 감리기준」및 「정보시스템 감리 수행 가이드」를 준용

w 감리 종료회의 개최

o 감리법인은 감리보고서 초안에 대하여 설명하고, 상호 검토 및 이견 사항을 청취하기 위한 감리 종료회의를 개최하여야 함

o 감리법인은 감리보고서 초안에 대하여 제기된 이견사항 및 근거자료, 논리 등을 면밀히 검토하여야 하며, 감리보고서 초안에 반영할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 이를 수정 반영하여야 함

y 감리보고서(감리수행결과보고서) 통보

o 감리법인은 감리종료회의 결과를 반영한 최종 감리보고서를 감리종료회의 후 10일 이내에 주관기관, 피감리기관에게 제출하여야 함. 단, 감리계획서에 감리수행결과보고서 제출일시를 별도로 명시한 경우에는 그에 따름

※ 감리결과 보고서는 감리대상 사업과 연관된 사업의 정보를 모두 포함하여야 함

' 감리결과 조치내역 확인 및 통보

o 감리법인은 주관기관으로부터 감리결과 조치내역 확인 요청을 받은 경우, 5일 이내 감리결과 조치 내역을 확인하여 주관기관에게 제출하여야 함. 단, 감리계획서에 시정조치 확인 및 통보일정을 별도로 정한 경우에는 그에 따름

※ "시정조치 확인보고서"의 서식은「정보시스템 감리수행가이드」를 준용함

⑩ 종료회의

o 발주자와 감리대상 사업자 및 관련 당사자들이 참석하는 종료회의를 실시하여야 함

- 감리기간 중 발생한 특이사항 및 문제점에 대하여 누락 없이 감리 보고서에 포함하여 작성하여야 함

① 감리결과 검수 요청

o 감리보고서는 책자 형식으로 제본 및 CD(혹은 USB 메모리, 외장 하드디스크 등 통상적인 기억매체)로 제작하여 제출하여야 함

- 감리보고서 2부, 감리보고서(CD) 1부
- 감리용역 수행 중 생산된 모든 산출물(공문, 회의록, 일지 등)을 CD로 제작하여 제출하여야 함

o 최종 감리 및 감리결과 조치내역 확인 등 계획된 용역이 모두 완료된 경우, 주관기관에 검수요청을 하여야 함

② 제약사항

o 사업수행 시 취득한 자료 및 사업 결과물은 외부 반출 불가함

③ 상주감리 원칙 (상주감리 추가 제안 시)

o 상주감리를 추가 제안 시 명확한 업무와 산출물을 제시해야 함

o 상주감리원은 단계감리에 참여할 수 없음

o 상주감리원의 조직 구성 및 투입계획과 교체투입, 투입시기 조정 등은 발주자로부터 사전에 승인을 받아야 함

나. 감리 중점사항

ㅎ 사업관리

o 계약문서 대비 사업관련 산출물의 일치성 점검 및 표준화 준수 점검·개선(안) 제시

- 사업관리를 위한 계획을 구체적이고 실행가능 수준으로 수립하였는지 여부 및 실행결과가 요구사항을 충족시킬 수 있는지 점검(범위관리,

변경관리, 일정/진척관리, 인력/자원관리, 위험관리, 의사소통관리 등)

- 제안요청서, 제안서, 사업수행계획서(품질관리, 일정관리, 인력관리 등) 등 사업관련 계약문서와 산출물의 일치성을 점검하고 개선(안)을 제시하여야 함
- 단계별 산출물 적정성 및 이행실태 점검을 통한 과업의 누수를 방지하여야 함 (착수, 요구사항, 진도, 위험, 변경 보안, 하도급, 검사, 종료 등)
- 사업자에게 감리수감 사전 교육을 실시하여야 함

j **사업 수행관리**

o 사업수행계획서, 품질관리, 위험관리, 일정관리, 보안관리, 하도급관리 등 계획 대비 이행실태를 점검하고 개선(안)을 제시

o 일정관리

- 일정계획 대비 과업이행 지연 시 사유를 확인하고, 개선(안)을 제시하여야 하며, 해당 과업이 종료될 때까지 이력관리를 하여야 함

  ※ 일정지연 사유가 사업자 소관이 아닌 경우라도 지연 사유를 관리해야 하며, 근거자료(회의록, 공문 등)를 명확히 점검해야 함

- 정기점검, 백업 및 복구, 취약점 점검, 모의훈련 등 각종 점검 및 훈련 계획서, 결과서 점검 등을 포함하여야 함

o 위험관리

- 사업수행 중 발생하는 각종 쟁점사항에 대한 원인 규명 및 해결방안을 제시하고, 이력을 관리하여야 함

  ※ 일정지연(장비도입, 시스템 개발 등), 사업자간 이견, 기술지원, 과업변경 등

o 품질관리

- 산출물 품질관리(표준화, 이력(형상)관리, 내용 충실도 점검 등) 및 사업 종료 시 사업자간(사업자와 운영 . 유지보수 사업자) 인수인계 사항 등을 점검하여야 함
- 산출물은 사업 방법론을 준용하여 점검하며, 필요시 산출물 양식을

추가, 보완하여 제시하여야 함

- 품질관리 표준화를 위한 별도의 방안을 제시할 수 있음

o 변경관리

- 과업변경, 인력변경, 물품변경 등 모든 변경에 대한 타당성을 검토하여 발주기관에 의견을 제시하여야 함
- 변경관련 모든 산출물(회의록, 협의록, 공문 등)과 이력관리는 업무관계자가 공유되고 협의되었는지 점검하여야 함

o 인력관리

- 사업 참여인력의 복무관리 계획 및 관리 대장 등을 점검하며, 특히 타 사업에 중복 투입 여부를 확인하여야 함
- 인력변경 사유 및 교체인력 적정성, 인수인계 내용을 점검하여야 함

o 의사소통관리

- 발주기관과 사업자, 사업자와 사업자간 등 업무 관계자간 의사소통 계획의 적정성 및 이행 여부를 점검하여야 함
- 개선·건의사항 등 애로사항을 청취하고, 발주기관에 제시하여야 함

o 보안관리

- 도입 장비(H/W, S/W, N/W 등) 및 시스템 설계에 대한 보안의 적정성을 점검하고 필요시 개선(안)을 제시하여야 함
- 사업자의 인력, PC, 비밀유지 등 관리적, 기술적, 물리적 보안계획의 적정성 점검 및 이행여부를 점검하여야 함
- 발주기관 보안관련 규정, 지침 준수여부를 점검하여야 함

o 하도급관리

- 제안서에 명시된 하도급 대금 지급 준수여부를 점검하여야 함
- 발주기관 하도급 관리지침에 따른 하도급 준수실태를 점검하고, 개선

(안)을 제시하여야 함

※ 하도급 관련 법·규정·지침·고시 등의 준수여부를 점검해야 함

r **응용시스템 분야**

o 사용자 요구사항 식별 및 반영의 적정성, 응용시스템 설계의 적정성

o 응용시스템 기능구현의 완성도, 충분성

o 사용자 편리성을 고려한 인터페이스 설계의 적정성

o 타 시스템, 외부 시스템과의 연계방안의 적정성

o 구현된 기능의 적정성

o 시험(단위, 통합) 계획 수립 및 수행의 적정성

o 현행 아키텍처·업무자료·시스템 분석의 적정성

o 개선과제 도출 및 개선모델 수립의 적정성

o 이행계획 수립의 구체성 및 실행 가능성

ㅓ **데이터베이스 분야**

o 데이터베이스 설계 표준 설정 및 준수의 적정성

o 데이터 모델링 적정성, 데이터베이스 설계의 적정성

o 데이터베이스 구현의 적정성, 데이터베이스 백업 및 복구방안

o 응용시스템의 기능과 연계된 데이터의 무결성 유지활동

o 공공데이터베이스 표준 적용 여부 점검

※「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제10조(정보화사업 수행 시 공공데이터베이스 표준 적용) 등 참고

o 이행 데이터의 정합성 점검

ㅅ 시스템 아키텍처 및 보안 분야

o 시스템 요구사항 분석의 적정성, 안전 및 신뢰성 설계의 적정성

o 개발 및 운영시스템 구조 설계 및 설치의 적정성

o 시스템 장애대책 및 복구대책

o 시스템 연계 식별, 설계 및 구현의 적절성

o 보안 요구사항 충족성

ㅂ 도입 장비 점검

o 사업자가 제안한 장비내역을 확인하여 불량 장비가 발주기관에 도입되지 않도록 점검하여야 함

w 법 · 규정 준수 여부

o 감리사업자는 정보화사업 감리관련 규정(법률, 지침, 가이드 등)을 준수해야 하며, 감리대상, 범위, 절차 등은 발주자와 협의 후 결정하여야 함

o 보안약점 진단 :「소프트웨어 개발보안 가이드」등

※「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제53조(보안약점 진단절차) 등 참고

o 웹 호환성 진단 :「전자정부서비스 호환성 준수지침」등

o 웹 접근성 진단 :「한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침」등

y 기능점수(Function Point) 검증

o 소프트웨어 개발 부분에 대한 기능점수 측정내역 검증

o「소프트웨어사업 대가산정 가이드」의 기능점수 방식(정통법) 기준

o 설계단계 후 기능점수 측정내역 검증 및 발주단계 규모와 비교(설계단계 감리 시)

o 구현단계 후 기능점수 측정내역 검증 및 발주단계 규모와 비교(종료단계 감리 시)

' 산출물

o 산출물

감리구분	산출물	비고
예비조사	감리계획서	「정보시스템 감리 수행 가이드」 첨부 서식 적용
단계별 감리	감리보고서	
조치확인	시정조치확인보고서	

o 산출물 제출시기

산출물 종류	제 출 시 기	제출수량			비고
		계	발주기관	사업자	
사업수행계획서	계약일로부터 10일 이내	1부	1부		
감리계획서	감리 개시 전 까지	2부	1부	1부	
감리보고서	감리 종료회의 후 10일 이내	4부	2부	2부	제본
					CD
감리 업무일지	감리 종료회의 후 10일 이내	1부	1부		
시정조치확인보고서	시정조치결과확인 후 5일 이내	4부	2부	2부	제본

※ 산출물 제출 시기는 발주기관과 협의하여 조정할 수 있음

2 개인정보 영향평가

가. 주요 과업 내용

ㅎ 사업관리

o 개인정보 영향평가 수행책임자(PL)는 관련자격증(NIA 개인정보 영향평가 전문교육 인증서 또는 개인정보관리사 자격증) 및 관련 분야 5년 이상의 수행 경험이 있는 자로 투입하여야 함

- 참여인력은 「개인정보 영향평가에 관한 고시」 제5조의 각호를 충족하는 자로 최소 2명 이상이어야 함
- 영향평가 수행인력은 본 사업의 영향평가 현장점검 기간 동안 기 수행중이거나 제안 중인 타 사업 일정과 중복될 수 없음
- 평가하고자 하는 사업 자체에 대한 이해와 개인정보보호 관련 법제 및 정책, 전략수립, 기술·시스템 분석 및 정보보안 등의 광범위하고, 다양한 전문 지식과 정보를 보유한 인력으로 구성
- 공사 내 유관 부서, 사업을 구축하는 업체, 외부 전문가 등과 협업

o 사업수행사는 발주기관과 상호 협의한 장소에서 사업을 수행하여야 함

j 관련 고시 준수

o 「개인정보 영향평가에 관한 고시」 및 「개인정보 영향평가 수행 안내서」에 따라 수행

o 효율적인 평가 수행을 위한 영향평가 수행계획 수립

- 평가목적, 평가대상 및 범위, 평가주체(평가팀), 평가기간, 평가절차(방법), 주요 평가사항, 평가기준 및 항목, 자료 수집 및 분석계획 등을 포함

o 문서 확인, 인터뷰, 현장방문을 통한 실사 등의 방법을 병행

o 평가 대상 사업에 적용되는 개인정보보호관련 법령 . 지침 및 가이드라인 . 내부지침 등 관련 정책 분석

o 개인정보 흐름 및 개인정보 침해 요인 분석, 위험평가를 실시

o 개인정보 영향평가 시 모든 침해요인을 도출하여 개선할 수 있도록 필요한 평가항목 선정

※ 영향평가 점검항목은 「개인정보보호법 시행령」 제38조 영향평가 기준에 따른 평가영역 및 분야를 준용

o 개인정보보호 관련 법규, 지침 등 관련내용을 반영한 개선방안 수립 및 컨설팅 제공

o 영향평가의 수행계획 및 결과 검토를 위한 착수 . 최종 보고회 개최

r **대상시스템의 기술적 보호조치의 적정성 분석 및 조치방안 마련**

o 접근권한 관리, 접근통제, 개인정보의 암호화, 접속기록의 보관 및 점검, 악성프로그램 등 방지, 물리적 접근방지, 개인정보 파기, 기타 기술적 보호조치, 개인정보처리구역 보호 등의 분석 및 개선방안 제시

ㅅ **시스템별 업무특성에 따른 암호화 적용 여부 및 개선범위 등 제시**

o Post 차세대시스템의 고유식별정보의 암호화 적용 범위 결정

※「개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시」제7조(개인정보의 암호화) 제5항에 따라 '고유식별정보를 저장하는 경우'에 해당하는 경우 '개인정보 영향평가의 결과에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정할 수 있도록' 함

o 암호화를 적용할 경우 성능저하, 데이터베이스 고유식별정보 재편성 및 프로그램 수정의 최소화 방안 마련

o 암호화가 적용된 시스템의 경우 적정성 여부 점검

o 외부 시스템과의 연계사항 등 암호화 개선 방안 제시

o 암호화가 적용될 경우 암호화 적용에 대한 간략한 영향평가 보고서 제출

ɻ **개인정보 영향평가 결과보고서 작성 및 검토회의 개최**

o 사업수행사는 현장점검 기간 중에 개인정보 영향평가 결과보고서 초안을 작성하여 발주기관 및 대상시스템 사업수행사의 이견사항을 검토 및 반영하여 결과보고서 작성 및 제출

ʁ **영향평가 결과보고서 통보**

o 사업수행사는 종료회의의 결과를 반영한 최종 영향평가 결과보고서를 종료회의 후 7일 이내에 발주기관에 제출

w **개인정보 영향평가 결과에 따른 개선방안 및 이행계획 수립방안 제시**

o 개인정보보호 관련 법규 위반사항 및 개인정보 영향평가 결과에 따른 시스템 개선방안 및 이행계획 도출방안 제시

- 단기개선 : 사업 기간 내 조치가 가능한 사항으로 자세히 제시
- 중장기 개선계획 : 소요예산 포함하여 이행계획 제시

y **영향평가 대상시스템에 대한 개인정보 취급자에 대한 교육방안 제시**

o 개인정보 영향평가 결과 및 후속 조치사항에 대하여 평가대상 시스템 개인정보 취급자 및 업무담당자 등에게 이전될 수 있도록 이에 필요한 교육 실시방안 제시

o 기타 결과물에 대하여 필요시, 관계자 대상 관련업계 전문가 교육제공 방안 제시 및 향후 사업 이후에도 추가적인 교육 요구, 개인정보 보호에 대한 기술 자문 수행방안 제시

' **행안부 지적사항 보완 방안 제시**

o 개인정보 영향평가 결과물을 행정안전부에 제출 후 지적된 사항에 대한 보완을 위하여 사업자는 지원체계, 인력을 제시

⑩ 종료회의

o 사업수행 시 취득한 자료 및 사업 결과물은 외부 반출 불가함

나. 영향평가 영역 및 분야

평가영역	평가분야	세부 분야
I. 대상기관 개인정보보호 관리체계	1. 개인정보보호 조직	개인정보보호책임자의 지정
		개인정보보호책임자 역할수행
	2. 개인정보보호 계획	내부관리계획 수립
		개인정보보호 연간계획 수립
	3. 개인정보 침해대응	침해사고 신고 방법 안내
		유출사고 대응
	4.정보주체권리보장	정보주체 권리보장 절차 수립
		정보주체 권리보장 방법 안내
II. 대상시스템의 개인정보보호 관리체계	5.개인정보취급자 관리	개인정보취급자 지정
		개인정보취급자 관리·감독
	6. 개인정보파일 관리	개인정보파일대장 관리
		개인정보파일 등록
	7. 개인정보처리방침	개인정보처리방침의 공개
		개인정보처리방침의 작성
III. 개인정보처리 단계별보호조치	8. 수집	개인정보 수집의 적합성
		동의 받는 방법의 적절성
	9. 보유	보유기간 산정
	10.이용·제공	개인정보 제공의 적합성
		목적 외 이용·제공 제한
		제공시 안전성 확보
	11. 위탁	위탁사실 공개
		위탁 계약
		수탁사 관리·감독

평가영역	평가분야	세부 분야
	12. 파기	파기 계획 수립
		분리보관 계획 수립
		파기대장 작성
IV. 대상시스템의 기술적보호조치	13. 접근권한 관리	계정 관리
		인증 관리
		권한 관리
	14. 접근통제	접근통제 조치
		인터넷 및 모바일 홈페이지 보호조치
	15. 개인정보의 암호화	저장시 암호화
		전송시 암호화
	16. 접속기록의 보관 및 점검	접속기록 보관
		접속기록 점검
		접속기록 보관 및 백업
	17. 악성프로그램등 방지	백신 설치 및 운영
		보안업데이트 적용
	18. 물리적 접근방지	출입통제 절차 수립
		반출・입 통제 절차 수립
	19. 개인정보의 파기	안전한 파기
	20. 기타 기술적 보호조치	개발 환경 통제
		개인정보처리화면 보안
		출력시 보호조치
	21. 개인정보처리구역보호	보호구역지정

V 제안서 작성 요령

1 제안서의 효력

□ 제출된 제안서의 내용은 제안사 임의로 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

□ 제안서에 제시된 내용과 공사 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

□ 공사는 필요시 제안사에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

□ 계약 후에도 제안서의 내용을 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우, 제안사는 모든 손해배상 책임 및 계약 해지 등 공사의 어떠한 제재에도 민·형사상 이의를 제기할 수 없음

2 제안서 작성지침 및 유의사항

가. 제안의 준비사항

□ 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 「전자정부법」 및 「정보시스템 감리기준」을 준용하며, 그 이외의 사항에 대하여는 공사와 감리업체 간의 협의를 통하여 결정하도록 함

□ 제안사는 본 제안요청서의 내용에 대하여 질의를 하거나 그에 필요한 정보를 요구할 수 있으며, 공사는 동 정보가 유익하다고 판단될 경우 모든 제안업체들의 질문에 설명 또는 서면을 통하여 답변을 하고, 제안 요청서의 변경이 있는 경우에는 변경사항에 대한 통보를 함

□ 각 제안사는 제안요청서에 제시된 정보들의 정확성에 대하여 스스로 확인하기 바라며, 공사는 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임을 지지 아니함

□ 제안사는 본 사업의 사업 범위별로 추진인력을 적정하게 산정하여 단계별로 제시하여야 함

□ 제안서에 명시된 인력은 교체가 불가능하며, 불가피한 경우 공사의 승인 절차에 의하여 교체가 가능함

o 감리인력 요건은「정보시스템 감리기준」제5장 준용

o 개인정보 영향평가 「개인정보 영향평가에 관한 고시」 제5조(영향평가 수행인력 자격)의 각호를 충족

o 사업 수행조직, 역할 및 일정에 대한 상세내용을 제시하여야 함

o 투입인력에 대한 계획 및 이력사항을 포함시켜 제시하여야 함

o 사업 참여인력 이력사항 첨부 시, 반드시 실제 프로젝트를 수행할 인력의 이력사항을 첨부하고 인원별 역할과 참여기간을 명시하여야 함

□ 본 사업의 추진과정에서 사업수행사의 업무상 과실, 보안사항 불이행 등으로 인하여 공사 및 제3자에게 손해를 입혔을 경우 해당 손실에 대하여 사업수행사는 민.형사상 책임을 지도록 함

□ 본 사업의 추진과정에서 공사의 방침 또는 계획의 변경으로 요구사항이 발생할 경우 이를 반영하여야 함

□ 용역계약 이후 산출물 리스트, 용역추진공정표, 인력 투입계획서 등이 포함된 착수보고서를 10일 이내 제출하여야 함

나. 제안서 규격

□ 제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡방향 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

□ 제안요약서는 A4 단면 30 페이지(양면 15장) 이내, 제안서는 A4 단면 300 페이지(양면 150장) 이내를 권고함

□ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함

□ 인쇄는 양면 및 단색(제안발표 자료 포함)으로 인쇄 권고

다. 용어사용

□ 제안서는 한글로 작성되어야 하나, 명확한 번역이 곤란한 용어 또는 일반적인 전문용어는 원어로 사용하고, 용어에 대한 해석을 명시하여야 함

□ 원본과 사본을 구분하여 표시(원본과 사본이 상이한 경우 원본 기준)

라. 제안서의 내용표현

□ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

o "사용가능하다", "할 수 있다", "고려하고 있다" 등의 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

마. 제안내용의 객관성

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증 요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외될 수 있음

바. 보충내용 출처표기

□ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

사. 제안내용의 손해배상 책임

□ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족하지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임을 져야 함

3 제안서 보상

□ 제안서를 작성하는데 소요되는 비용은 제안사가 부담하며, 제출된 제안서는 반환하지 아니함

□ 본 사업은 제안서 작성비용의 보상가능 사업금액 기준(20억원 이상)에 해당하나 제안서 보상 예산을 별도로 책정하지 않았으므로 입찰자가 제출한 제안서에 대해서 별도의 보상은 하지 않음

4 제안서 목차 및 세부 내용

□ 아래의 작성 목차 및 요령에 따라 순서대로 작성하되, 제안사가 추가로 제시할 내용이 있는 경우 각 항목의 마지막 부분에 별도 기재 요망

□ 필요시 내용을 가감하여 사용 가능하며, 제안사 양식으로 작성

목차	세부 내용
Ⅰ. 제안업체 일반	
1. 일반현황 및 주요연혁	○ 제안사 설립, 연혁, 조직도 (붙임 1호 서식)
2. 재무구조	○ 최근 3개년 주요사업내용, 매출액 포함 (붙임 2호 서식)
3. 주요 사업내용	○ 최근 3개년 공공기관 중심으로 기술
4. 조직 및 인원현황	○ 제안 회사 조직 현황을 제시
5. 주요 보유 기술	○ 본 사업과 관련된 주요 보유 기술 작성

목차	세부 내용
Ⅱ. 제안개요	
1. 제안의 배경	○ 대상 사업의 기술구조, 적용방법론, 업무형태 등에 대한 분석과 제안업체가 성공적으로 수행할 수 있는 이유를 기술적/업무적으로 명확히 기술 ○ 제안업체가 대상사업의 기술구조, 업무형태 등과 관련하여 보유하고 있는 기술, 경험을 기재
2. 제안의 범위	○ 구체적인 사업 범위, 전체 조건 및 대상 기술
3. 제안의 특장점	○ 차별화될 수 있는 제안의 특징과 장점 기술
4. 기대효과	○ 제안을 통해 얻을 수 있는 기대효과
Ⅲ. 사업수행 방안	
1. 사업추진 전략	○ 대상 사업에 대한 감리 접근방법, 감리 추진전략, 감리 수행절차 등의 독창성/차별성을 파악할 수 있도록 기술
2. 예상 문제점 및 주요 점검항목	○ 대상 사업에 대해 성과목표 대비 예상되는 주요 문제점과 점검항목, 이를 객관적으로 점검 및 확인할 수 있는 방법 제시 ○ 감리 분야별 주요 점검항목 및 증적 확보 방안 제시 (점검항목의 단순 나열식 작성은 지양)
3. 감리 자동화도구 적용계획	○ 제안업체가 보유하고 있는 자동화도구(성능시험도구, 데이터베이스 점검도구, 네트워크/보안 점검도구 등) 중에서 대상 사업에 대하여 실제 적용 가능한 계획 및 예상 결과를 제시 ○ 수행 단계, 업무형태 등에 적합한 실제 적용계획을 구체적으로 제시해야 함
4. 추진조직	○ 사업추진 조직도 및 참여인력 현황을 기술 (붙임 3호 서식) - 사업추진 조직도 - 감리 수행 인력편성, 업무분장 내역
5. 투입인원 구성	○ 감리원 편성에 대한 근거 제시(충분성)

목차	세부 내용
	○ 감리원별 참여율, 투입분야 및 상근 감리원의 비율 표기 (붙임 4호 서식) ○ 수행 단계별 투입인력 기술 ○ 사업관리자의 기술자격, 대상사업 관련 업무·감리 수행경력 제시 ○ 투입인력의 자격 및 경력 사항 기술 (붙임 5호 서식)
6. 수행절차 및 추진일정	○ 단계별 감리 일정 및 세부 감리절차, 점검항목, 방법 제시 ○ 과업이행여부, 기술적용계획표 등 필수점검사항에 대한 점검방법을 구체적으로 제시 ○ 개인정보 영향평가 방법론에 따른 일정 및 세부 절차 제시
7. 중점 검토항목	○ 본 제안요청서의 주요 과업내용을 참고하되, 대상 사업의 특성을 고려하여 중점적으로 검토할 항목을 기술
8. 사후관리 방안	○ 감리지적 사항에 대한 이행확인 방법 제시
Ⅳ. 사업관리 및 품질보증	
1. 품질보증 계획	○ 감리지침 또는 기술을 적용하여 감리관점의 일관성 유지, 중복지적방지, 감리원 간 원할한 의사소통을 통한 감리결과의 상호조율 등 감리의 정확성과 감리품질을 보증하기 위한 방안 제시
2. 보고 및 검토 계획	○ 착수보고회 및 감리결과 검토회의 등의 시기, 일정, 방법 등을 상세히 기술
3. 교육 및 기술지원	○ 교육 계획 및 기술지원 방안 기술
4. 보안관리 방안	○ 사업수행 중 열람, 면담, 기타 방법으로 취득한 자료에 대한 보안 방안 기술
Ⅴ. 기타 지원사항 등	
1. 기타사항	○ 기타 본 사업의 성공적 수행을 위해 추가 제안하고자 하는 사항

Ⅵ 제안 안내 사항

1 사업자 선정 방식

□ 계약 형태 : 협상에 의한 계약

o 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제43조의 2(지식기반사업의 계약방법)에 의거하여 협상에 의한 계약체결 방법 적용

o 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 「협상에 의한 계약체결기준」 제8조(협상적격자 및 협상우선순위의 선정) 준용

2 입찰 참가 자격

가. 공통

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동 시행규칙 제14조에 의한 유자격자이어야 함

□ 입찰등록마감일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당하지 않는 자이여야 함

□ 공동수급에 관한 사항

o 공동수급(분담이행방식)이 가능하며 구성원은 감리업무(86%)와 개인정보 영향평가(14%)를 담당할 2개사로 구성되어야 하며 이 경우 대표사는 감리업체

※ 시스템 구축 사업을 감리한 업체가 동일한 사업에 대한 영향평가 수행 불가

- 입찰서를 제출한 후에는 공동수급협정서를 제출할 수 없음
- 공동수급체를 중복 결성하여 입찰에 참여할 수 없음
- 공동수급에 참여하는 업체도 동일한 입찰 참가 자격을 충족하여야 함

□ 본 사업은 하도급을 불허함

나. 감리

□ 「정보시스템 감리기준」 제2조 제2호에 의한 감리법인이어야 함

1. 「전자정부법」 제58조 및 제61조의 규정에 따라 행정안전부에 감리법인(업종코드: 6146) 및 소프트웨어사업자(업종코드:1468)로 등록된 감리법인 중 다음 각 호에 해당하지 않는 법인
2. 사업자와 감리법인이 같거나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조 제1호에 의한 지주회사, 자회사, 손자회사의 경우 또는 동법 제2조 제2호에 의한 동일 기업집단에 속한 경우
3. 사업자와 감리시행자가 임·직원의 관계에 있는 경우
4. 사업자 및 감리법인의 대표자 또는 투입 감리원이 민법 제777조에 의한 친족관계에 있는 경우
5. 해당 정보시스템 계획, 구축 또는 운영에 참여하였던 자가 감리원으로 투입되는 경우
6. 감리법인이 해당 사업자와 사업상 경쟁관계에 있는 경우
7. 기타 감리 독립성을 침해할 수 있는 특수 관계에 있는 경우

□ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 조달청 나라장터에 입찰마감일 전일까지 정보시스템 감리 법인(업종코드:6146) 및 소프트웨어사업자(업종코드:1468)로 입찰참가자격을 등록한 업체

다. 개인정보 영향평가

□ 「개인정보 보호법」 제33조 및 「개인정보법 시행령」 제37조, 제38조에 따라 개인정보 영향평가 기관으로 선정(지정)되어 본 계약 체결일까지 해당 자격을 유지되고 있는 사업자

※「개인정보 영향평가에 관한 고시」 제2조 3. 행정안전부장관이 지정한 기관 적용

□ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 조달청 나라장터에 입찰마감일 전일까지 개인정보 영향평가기관(업종코드:6525)으로 입찰참가자격을 등록한 업체

3 제안서 제출일정 및 방법

가. 제안요청 설명회

□ 일시 및 장소 : 2024.07.30.(火) 13:30 서울 여의도 태흥빌딩 7층 대회의실 (주소 : 서울 영등포구 의사당대로 8)

□ 준비물 : 임직원 여부를 확인할 수 있는 자료(신분증 및 명함)

□ 기타 사항

- o 제안요청 설명회 참석여부는 입찰참가 자격과는 무관함
- o 참여를 희망하는 업체는 제안요청 설명회 개최 전일 18시까지 하단 문의처로 설명회 참석 의향 및 질의서 제출
- o 원칙적으로 제출된 질의서에 대한 답변을 중심으로 설명회가 진행되며, 추가 질의 사항에 대하여는 현장 답변 또는 추후 전자메일로 답변
- o 문의처 : 디지털사업팀 차장 최준오 (juno@khug.or.kr, ☎02-3771-6293)

나. 제안서 제출

□ 제출방법 : 입찰공고문에 따름

□ 제출자료

- o 입찰공고에서 지정한 제안서류 일체를 시스템을 통하여 전자파일(PDF 파일) 형식으로 제출하여야 하며, 제안서류 일체의 용량은 200MB를 초과할 수 없음
- o 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료 등은 제안서 파일에 포함하여 제출

다. 제안서 발표

□ 사업관리자(PM)의 전문성, 사업이해도 등을 종합적으로 평가하기 위해 본 사업을 수행할 사업관리자(PM)가 직접 제안서를 발표하여야 함

o 제안발표자가 사업관리자(PM)와 다를 경우 발표 없이 서류만으로 평가

o 제안서, 제안요약서, 제안설명회 발표자료를 제외한 모든 간접발표(동영상 등)는 불허함

o PM의 주요 이력사항을 제안서에 첨부해야 함

4 제안서 평가방법

□ 제안서 평가 원칙 : 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 산출함

o 평가비율 : 기술평가(90점), 가격평가(10점)

o 종합평가 점수 = 기술평가 점수 + 가격평가 점수

□ 기술평가 방법

o 기술평가는 조달청에서 평가위원회를 구성·운영하여 실시함

o 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」제4조 제5항에 따라 본 사업은 기술능력평가의 변별력을 확보하기 위하여 기술능력평가 점수 총배점한도를 기준으로 3점의 순위간 점수차를 지정하여 차등점수제를 부여함

o 다만 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수보다 큰 경우에는 원점수차를 적용하며, 차등점수를 부여한 후 기술능력평가점수와 가격평가점수를 합산하여 동점인 경우에는 기술능력평가점수에 따라 순위를 정함

□ 우선협상대상자 선정 및 계약체결

o 제안서 평가 결과 입찰가격이 예정가격 이하인 자로서 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

o 협상적격자 중 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합한 점수가 1위인 자를 우선협상 대상자로 선정하여 사업추진방안, 조건 등을 협상

o 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상 실시

o 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰 추진

o 기타 규정되지 않은 사항은 계약예규에 의함

5 제안서 평가기준 및 배점

가. 기술평가 평가기준 및 배점

평가항목	세부평가항목	평가기준	배점
계획부문 (5)	경영상태	- 신용평가기관의 평가등급 참조	5
감리수행 (25)	점검내용	- 감리대상사업의 특성 등을 감안하여 주요 위험요소와 예상문제점을 적정하게 도출하였는지와 도출된 위험요소 및 예상문제점을 반영하여 단계별로 점검사항을 적정하게 도출・제시하였는지를 평가한다.	9
	점검방법	- 과업이행여부, 기술적용계획표 등 필수점검사항에 대한 점검방법을 구체적으로 제시하였는지와 점검결과의 객관성・타당성 확보를 위한 점검 기법・방법을 구체적으로 제시하였는지를 평가한다.	8
	감리일정 및 절차	- 감리대상사업 단계별 감리일정 및 세부 감리절차를 적정하게 제시하였는지와 각 단계별 시정조치확인에 투입되는 감리인력, 기간, 수행방법 등을 구체적으로 적정하게 제시하였는지를 평가한다.	8
감리인력 (25)	감리인력 구성	- 분야별 위험도 및 업무량 등을 감안하여 적정 수준의 감리인력을 배치하였는지와 투입 감리인력 중 상근감리원의 비율이 적정한지를 평가한다.	9
	총괄감리원	- 총괄감리원이 업무수행을 위해 필요한 기술자격, 유사 업무・감리 수행경력 등 전문성을 갖추었는지를 평가한다.	8
	각 분야별 감리인력	- 투입 감리인력(다른 분야 전문가 포함)이 담당분야와 관련된 업무 또는 감리수행경력 등 전문성을 갖추었는지와 투입 감리원(총괄감리원 포함)의 계속교육 이수실적(이수한 교육의 종류 및 시간)을 평가한다.	8
개인정보 영향평가 (25)	평가 대상 선정	- 평가 범위 및 대상선정의 적정성을 평가한다.	5
	영향평가 계획	- 개인정보 영향평가 수행방안의 적정성을 평가한다.	5
	인력 구성	- 참여인력의 유사업무 경험, 수행경력 등을 평가한다.	10
	일정 및 절차	- 평가 일정 및 절차, 일정 준수계획 등을 평가한다.	5
지원부문 (10)	교육훈련 및 품질관리	- 감리수행절차 또는 감리보고서 품질향상을 위해 감리법인 차원에서 체계적인 교육훈련 또는 품질관리 등을 수행하고 있는지를 평가한다.	5
	자동화도구 및 기법 활용 등	- 시험・진단 또는 점검을 체계적으로 수행하기 위한 자동화 도구 및 기법 등을 적정하게 제안하였는지 그리고 기타 발주자가 제안요청한 사항(감리범위 및 인력투입 등)에 대하여 적정하게 제안하였는지를 평가한다.	5
합 계			**90**

나. 정량평가 배점기준

<table>
<tr><th>평가항목</th><th>평가기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>경영 상태
(5점)</td><td>

o 경영상태 평가기준

<table>
<tr><th colspan="3">신용평가등급</th><th rowspan="2">배점</th></tr>
<tr><th>회사채</th><th>기업어음</th><th>기업신용평가등급</th></tr>
<tr><td>AAA, AA+, AA0, AA-
A+, A0, A-, BBB+, BBB0</td><td>A1, A2+, A20,
A2-, A3+, A30</td><td>AAA, AA+, AA0, AA-,
A+, A0, A-, BBB+, BBB0</td><td>배점의
100%</td></tr>
<tr><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>A3-, B+, B0</td><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>배점의
95%</td></tr>
<tr><td>B+, B0, B-</td><td>B-</td><td>B+, B0, B-</td><td>배점의
90%</td></tr>
<tr><td>CCC+ 이하</td><td>C 이하</td><td>CCC+ 이하</td><td>배점의
70%</td></tr>
</table>

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

</td><td>절대
평가</td></tr>
</table>

6 유의사항 및 기타사항

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

□ 낙찰자로 결정된 이후에 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 기타 사항은 「공동계약운영요령」(기획재정부 계약예규)을 따름

□ 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「협상에 의한 계약체결 기준」, 「공동계약운용요령」 등 국가계약관련 법령 및 지침, 고시 등을 준용하여야 함

□ 발주자는 제안사가 제출한 제안서나 기타 첨부 자료 등의 오류 또는 누락에 대하여 책임지지 않음

□ 제출된 제안서에 기재된 내용은 사실과 일치하여야 하며, 발주자가 요구하지 않는 한 수정, 추가 또는 대체할 수 없음

□ 발주자는 제안서의 내용이 사실과 다른 경우 해당 제안사를 협상 대상에서 제외할 수 있음

□ 제안서 작성 시 필요한 경우 공사를 방문하여 필요한 내용을 확인할 수 있으며, 공사와 미리 요구내용과 방문 일정을 협의

□ 본 제안요청서의 전부 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 되며, 선정된 사업자는 공사의 보안요청을 준수할 것에 동의하여야 함

□ 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 조사 및 분석자료 등 일체의 자료를 비공개로 취급하여야 하며, 외부에 유출 또는 타 용도로 사용되지 않도록 함

□ 본 사업과 관련된 모든 이해관계자(공사, 조달청, 제안서평가위원, 제안사 등)는 공정하고 투명한 입찰 진행을 위해 관련 법과 원칙을 준수하여야 함

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」에 따라 과업심의위원회를 실시한 사업임

ㅇ「소프트웨어 진흥법」제50조, 동 법 시행령 제47조에 따른 과업내용의 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 사업자는 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있음(소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침 별지 8호서식 참조)

□ 안전보건수준평가

o 본 사업은 「산업안전보건법」 제61조에 의거, 적격 수급인 선정을 위하여 안전보건수준 평가를 실시함

- 평가항목 및 기준은 [붙임8호 서식] 수급업체 안전보건수준평가 세부 기준에 의하며, 평가결과 C등급 이상의 업체를 적격 수급인으로 함

※ 평가항목별 세부 평가기준은 고용노동부「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼」 [붙임1] 수급업체 안전보건수준평가 세부기준에 따름

o 제안서 제출 시 [붙임8호 서식] 서식의 수급업체 안전보건수준 자가 평가표를 작성·제출하여야 하며, 평가결과를 증빙할 수 있는 자료를 함께 제출하여야 함

o 자료제출이 미흡할 경우 해당 항목을 감점 또는 재평가할 수 있음

□ 사업 관련 문의처

ㅇ 디지털사업팀 고성호 팀장(☎02-3771-6291, kshnote@khug.or.kr)
ㅇ 디지털사업팀 최준오 차장(☎02-3771-6293, juno@khug.or.kr)

□ 불편사항 이의제기 접수처

ㅇ 이의제기 담당관 : 준법지원처 윤리준법팀 류재은 팀장(☎051-955-5870)
ㅇ 홈페이지 : http://www.khug.or.kr/hug/web/ci/em/ciem000023.jsp 부조리갑질신고센터

[붙임 1호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		

주요연혁

[붙임 2호 서식]

재무현황 (최근 3년)

(단위 : 백만원, 부가세 포함)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금				
매 출 액	PMO			
	SI			
	컨설팅			
	감리			
	기타			
	합 계			
당 기 순 이 익				
자 기 자 본 비 율				

별첨 : 신용평가등급 확인서

[붙임 3호 서식]

사업추진 조직도

1. 총괄구성도

※ 부분별 조직 구성인력은 상근자 기준으로 작성, 부분별 책임자 명시

2. 인력 투입계획 총괄표

단계	수행활동	수행절차	세부일정	소요일수 및 공수
_____단계	예비조사	예비조사 및 감리계획 수립		(　　)일 / (　)MD
	감리시행	착수회의		(　　)일 / (　)MD
		현장감리		
		종료회의		
		감리수행결과보고서 제출		
	사후관리	시정조치 결과 확인		(　　)일 / (　)MD

※ 수행활동과 수행절차, 소요일수, 세부일정 및 소요일수는 공고내용을 참조하여 제안업체에서 자체적으로 계획을 수립하여 작성
※ 소요일수 및 공수는 해당 수행활동의 소요일수와 현장 투입 인원수를 근거로 작성
※ 사전문서 검토는 감리 투입공수로 인정하지 않음.

[붙임 4호 서식]

참여인력 요약

단계	업무분야	상근 여부	성명	감리원 번호	구분	현장감리 투입률	유사감리 및 경력자격 요약
					총괄감리원		
					수석감리원		
					감리원		
					전문가		
감리팀 구성의 특징 및 차별성							

※ 구분 항목에는 총괄감리원, 수석감리원, 감리원, 전문가를 구분하여 기재

※ 유사 감리 및 경력, 자격 요약은 해당 감리원이 본 사업의 감리원으로 적합함을 나타내기 위한 사항을 요약하여 기술(상세 내용은 감리원 실적 및 경력 서식에 기술)

※ 상근여부는 상근/비상근 감리원 표시

[붙임 5호 서식]

참여인력 이력사항

감리원		담당분야	

● **유사 감리 실적 : 총_____건**

번호	연도	사업명	발주기관	공공/민간	담당분야	역할	참여율
1							
2							
3							

● **대상사업과 관련된 감리 이외의 경력 : 총_____년**

기간(년)	경력	담당업무	유사 경력의 근거

● **보유 자격 현황 : 총____개**

자격증 명	발급처	자격구분	관련 분야
		국가자격	
		국가공인	

※ 참여하는 개별 감리원별로 각각 기재하며, 각 항목별로 가장 대표적인 사항 기준으로 최대 2페이지 이하로 작성하여야 함
※ 자격구분은 국가자격 또는 국가공인 여부를 구분하여 기술함
※ 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음
※ 소속회사에 대한 재직증명서와 국민연금 가입자 가입증명(국민연금 : www.nps.or.kr) 또는 건강보험자격득실확인서(국민건강보험공단, www.nhic.or.kr) 자료 제시

[붙임 6호 서식]

비상근 감리원 참여동의서

본인 _____은(는) _____년 월 일부터 년 월 일까지 수행되는 _____위탁감리수행에 대해 비상근 감리원(oo분야 전문인력)으로서 참여함을 동의하며, 감리결과에 대한 책임과 의무를 다하겠습니다.

년 월 일

동의자 소속 및 직위 :

생 년 월 일 :

성 명 : (인) 또는 서명

주택도시보증공사 사장 귀하

[붙임 7호 서식]

외부 용역사업 보안특약

① 사업자는 주택도시보증공사의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 주택도시보증공사에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 주택도시보증공사는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료 시 주택도시보증공사 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준
[별표 2] 보안 위약금 부과 기준
[별표 3] 누출금지 대상 정보
[별표 4] 보안관리 세부 이행사항

【별표 1】

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보 · 신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진 · 공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 관리자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통 · 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실 · 보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비 · 시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드 · P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발 · 유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 반입 노트북, PC 및 서버 등 정보통신 장비 무단 반출	○ 위규자 및 관리자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 주택도시보증공사 제공 중요정책 · 민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안 · 보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책 · 현안자료를 휴지통 · 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷 · 서류함 · 책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제 · 제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍 · 책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅 · 화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 교체 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기 · 인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보 · 보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면 · 구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

【별표 2】

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급(심각)	B급(중대)	C급(보통)	D급(경미)
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금액의 2%	계약금액의 1%	계약금액의 0.5%

*** 위규 수준은 [별표1] 참고**

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

*** 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과**

3. **사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산**

4. 위 위약금과는 별도로 용역업체의 과실로 인한 정보유출등 보안사고 관련 손해배상금, 과징금 등의 금전적 손실 발생시에는 사업종료 후에도 주택도시보증공사에 변상하여야 함

【별표 3】

누출금지 대상정보

1. 주택도시보증공사 소유 정보시스템의 내.외부 IP 주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정 · 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석 · 평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템 · 방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터 · 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9.「개인정보보호법」제2 조제1 호의 개인정보

10. 국정원「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비

11. 그 밖에 주택도시보증공사에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

【별표 4】

보안관리 세부 이행사항

❑ 참여 인력에 대한 보안관리

① 사업 착수 시

- 사업 참여인원 및 업체 대표명의 보안서약서를 제출하여야 한다.
- 계약업체는 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 주택도시보증공사의 규정에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 한다.

② 사업 수행 시

- 계약업체는 보안인식강화를 위해 주기적으로 자체 보안교육을 실시해야 하며, 주택도시보증공사가 요구하는 보안교육에 참석하여야 한다.
- 사업 참여인원은 용역사업자가 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우(해외여행 포함) 발생시 발주부서에 즉시 보고
- 용역사업과 관련한 보안관리 책임은 용역업체 대표에게 있으며, 대표는 용역사업 전반의 보안업무를 수행하는 '보안관리책임자'를 지정
  . 보안관리책임자는 용역사업과 관련된 인원.장비.자료에 대한 보안업무 및 사업과 관련된 하도급업체의 보안관리 전반을 총괄

③ 사업 종료 시

- 계약업체는 주택도시보증공사로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간.최종산출물 등 모든 자료를 전량 주택도시보증공사에 반납하고 삭제하여야 한다.
  . 복사본 등 별도 보관 금지
- 노트북.보조기억매체 등 전자적으로 기록된 자료는 국가정보원의 '정보시스템 저장매체 불용처리 지침(사안-655, 06.3.13)'에 따라 Format한 후 반출
- 계약업체는 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "보안조치 시행 확약서" 작성하여 주택도시보증공사에 제출하여야 한다.

❑ 문서 및 전산자료에 대한 보안관리

① 주택도시보증공사 정보보안업무지침에 의거 정보통신망 구성도, 정보시스템 구성도, IP 현황, 용역사업 산출물 및 개인정보 등은 대외비 및 비공개 자료로 분류하여 관리해야 한다.

② 계약업체는 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 '자료수불대장'을 작성하여 인계자(발주부서 담당자)와 인수자(용역업체 보안관리책임자)가 직접 서명한 후 인계.인수해야 한다.

③ 발주부서가 계약업체에 제공한 내부 자료는 복사.외부반출을 금지하며, 내부자료 중 비공개 자료는 매일 퇴근 시 발주부서에 반납토록 하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 시건장치가 된 보관함에 보관하여야 한다.

④ 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주부서의 파일서버에 저장하거나 발주부서 담당자가 지정한 PC에 저장.관리하여야 한다.

⑤ 계약업체가 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부에서 전자우편 등으로 주택도시보증공사와 자료 송수신이 필요한 경우에는 암호화 등의 보안대책을 마련하여 수발신해야 한다.

다만, 주택도시보증공사 보안업무취급규정에 의한 비공개 자료, 대외비 자료 및 비밀자료는 전자우편으로 수.발신을 금지한다.

⑥ 계약업체는 인터넷 이용 시 접속이 제한된 사이트 및 인터넷 파일공유(P2P) 사이트 등에 접속을 시도하여서는 아니 되며, 사업수행 관련 자료는 인터넷, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지한다.

⑦ 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 발주부서장의 허가 없이 무단 제공.대여.열람을 금지한다.

❑ 사무실 및 장비에 대한 보안관리

① 용역사업 수행 장소는 시건장치와 통제가 가능한 사무실을 사용한다.

② 발주부서 담당자는 용역업체 사무실에 대한 정기적인 보안점검을 실시하여야 한다.

③ 반입된 노트북.PC는 사업 종료시까지 반출 금지하며, 다만 부득이하게 외부반출이 필요한 경우에는 최소한의 장비만 반출승인하고 자료유출에 대비한 발주부서 담당자의 보안조치를 실시한 후 전상장비 반출입대장 기재 후 반출하여야 한다.

④ 계약업체는 용역사업에 이용되는 노트북.PC에 백신 등의 자체 PC보안프로그램 및 주택도시보증공사에서 제공하는 자료유출방지 등을 위한 PC보안프로그램을 설치하여야 한다.

⑤ 계약업체는 노트북 및 PC에 전원기동(CMOS) 패스워드, 윈도우 로그인 패스워드, 화면 보호기(10분 간격) 패스워드를 영문자 및 숫자가 조합된 9글자이상으로 설정하여야 한다.

⑥ 계약업체는 주택도시보증공사에 서버, 네트워크, 보안장비 등 정보시스템을 구축하여 납품하는 경우 정보보안담당관이 요구한 정보시스템 보안 취약점 점검을 받아야 한다.

내.외부망 접근시 보안관리

① 용역사업 수행시 발주기관의 전산망 이용이 필요한 경우

- 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 부여한다.
- 계정별로 부여된 접속권한은 불 필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정 폐기
- 계약업체는 정보시스템 사용자 계정(ID) 이용시, 부여된 권한 이외의 접근을 하여서는 아니되며, 부여된 패스워드는 임의 변경 및 타인에게 알려서는 아니된다.
- 주택도시보증공사의 전산망을 사용하는 계약업체의 노트북.PC는 인터넷 연결을 금지한다. 다만, 사업 수행상 필요한 경우에는 계약업체의 보안관리책임자가 직접 요청하고, 발주부서 담당자는 필요성이 인정될 경우 특정 노트북.PC을 지정하고 정보화지원처의 정보보안담당자에게 필요한 사이트만 접속토록 요청하여야 한다.

② 시스템 유지보수 및 관제는 원격관리를 원칙적으로 금지한다.

보조기억매체 제한

❍ 계약업체는 USB 등 이동식 보조기억매체를 주택도시보증공사 내외로 반.출입 할 수 없다. 다만, 발주부서의 부서장이 그 필요성을 인정한 경우에는 주택도시보증공사「정보보안업무지침」등 반출.입 절차에 따라 반출.입 할 수 있다

기타

❍ 상기 내용 중 언급되지 않은 사항은 국정원「보안업무규정」,「주택도시보증공사 정보보안업무지침」,「국가정보보안기본치침」등 관계법령 및 규정 적용

[서식 제1호]

보 안 서 약 서

(용역 . 파견업체용)

주택도시보증공사(이하 ‘ 귀사 ’)의 업무를 수행하는 협력회사, 상주파견업체, 기타 외부 업체 직원들은 본 서약서가 근무기간뿐 아니라 파견해제 후에도 일정기간 적용될 수 있음을 인식하고 숙독하신 후 서명하시기 바랍니다.

1. 나는 귀사로부터 취득한 모든 정보를 귀사 관련 업무에 한해 이용하겠음.
2. 나는 귀사로부터 제공받은 정보자산(서류, 사진, 전자파일, 저장매체, 정보통신장비 등)을 무단변조, 복사하지 않겠으며, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠음.
3. 나는 상대가 누구이건 간에(귀사직원, 고객, 혹은 계약직 사원) 알 필요가 없는 자에게 귀사 혹은 제3자의 소유정보를 누설하지 않겠음.
4. 나는 허가 받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 귀사관련 업무를 수행할 때만 사내데이터 처리시설을 이용하고, 이 귀사 내에 사적 정보를 보관치 않겠음.
5. 나는 귀사에서 승인받지 않은 프로그램, 정보저장 매체(Zip Drive, CD-ROM, USB, 외장 HDD 등)를 귀사 내에서 사용치 않겠음.
6. 나는 귀사가 정보자산을 보호하기 위해 귀사통신망을 통해 수발신 되는 전자문서를 점검할 수 있음을 알고 있으며, 이에 협조하겠음.
7. 나는 귀사의 정보보호 정책 및 지침, 절차를 준수할 것이며, 업무와 관련한 문서의 생성, 사용, 폐기 시 문서규정에 의거 규정을 준수하겠음.
8. 나는 나에게 할당된 사용자 ID, 패스워드, 출입증 등을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠음.
9. 나는 퇴직(프로젝트 종료, 파견해제)시 귀사에서 제공받은 귀사소유 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 이후에도 귀사의 모든 영업비밀은 물론이고 기타 누설됨으로 인하여 귀사에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대하여는 이를 일체 누설치 않겠음.

상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며, 위 사항을 준수하지 않음으로서 발생하는 모든 문제에 대하여는 민.형사상의 책임은 물론 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

소 속 : 생년월일 : 성 명: (서명)

첨부 신분증 사본1부. (발급시 담당자 확인 후 즉시 파기함)

담당자 확인	

□ **개인정보 수집.이용에 관한 일반사항**

○ 수집목적 : 보안사고 예방 및 사고 발생시 경위 파악

○ 수집항목 : 소속, 생년월일, 성명 ○ 보유 및 이용기간: 5년(보유기간 경과시 파쇄)

□ **동의하지 않을 권리 및 미동의시 불이익**

○ 출입증 발급신청자 및 일일출입자는 우리 공사의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 미동의시 보안업무취급규정 제 36조에 의거 사옥 출입이 제한되거나 출입증 발급이 거부될 수 있음.

본인은 상기 내용에 대해 사전에 충분히 인지하였으며, 주택도시보증공사의 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. **동 의 자 :** (서명)

주택도시보증공사 사장 귀하

[서식 제2호]

보안조치 시행 확약서

(　　)용역이 종료됨에 따라 용역사업에 사용한 개발서버, PC, 노트북, 보조기억매체 등 일체의 정보시스템을 통해 주택도시보증공사의 내부자료 및 용역 결과물이 유출 되는 것을 방지하기 위하여 관련 정보시스템을 복구가 불가능하도록 완전 소거하는 등의 보안조치를 시행하였으며, 본 용역관련 자료는 전혀 보유하고 있지 않음을 확약합니다.

20　.　.

회 사 명 :

대표이사 :　　(인)

[서식 제3호]

전산장비 반출 · 입 대장

용역사업명 : 〈관리책임자 : 〉

용역사업업체명 :

용역기간 :

용역사업 발주부서 담당자 :

장비명	관리번호	사용자	용도	전출입 일시 (입・출 구분)	반출시 중요데이터 존재 여부 점검	반입시 바이러스 백신점검	확인자 성명	확인자 서명

[서식 제4호]

자 료 수 불 대 장

용역사업명 :

용역사업업체명 :

용역기간 :

용역사업 소관 담당자(공사) :

일 자	자료 제목	인수인	서 명	인계인	서 명	반납 일자	반납확인자 성명	서 명	비 고

[붙임 8호 서식]

수급업체 안전보건수준평가 자가평가표

□ 사업명 :

구 분	배점	득 점
합 계	100	
A.안전보건관리체제	20	
B.실행수준	40	
C.운영관리	20	
D.재해발생 수준	20	

□ 평가항목 및 기준

평가항목	평가기준	배점	득점
A. 안전보건관리체제	소계	20	
1. 일반원칙	○ 도급·수급인의 안전보건방침 적정 여부	5	
2. 계획수립	○ 산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부	10	
3. 역할 및 책임	○ 이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(본사, 현장)	5	
B. 실행수준	소계	40	
4. 위험성평가	○ 도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해 · 위험요인 평가수준	5	
5. 안전점검	○ 안전점검 및 모니터링	10	
6. 이행확인	○ 안전조치 이행여부 확인(도급업체의 지도조언에 대한 이행 포함)	10	
7. 교육 및 기록	○ 안전보건교육 계획 및 기록관리	5	
8. 안전작업허가	○ 유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행수준	10	
C. 운영관리	소계	20	
9. 신호 및 연락체계	○ 도급·수급업체 간 신호체계 및 연락체계	10	
10. 위험물질 및 설비	○ 유해·위험 물질 및 취급 기계·기구·설비의 안전성 확인	5	
11. 비상대책	○ 비상시 대피 및 피해 최소화대책(고용부, 소방서, 병원 포함)	5	
D. 재해발생 수준	소계	20	
12. 산업재해 현황	○ 최근 3년간 산업재해발생 현황	20	

□ 등급분류

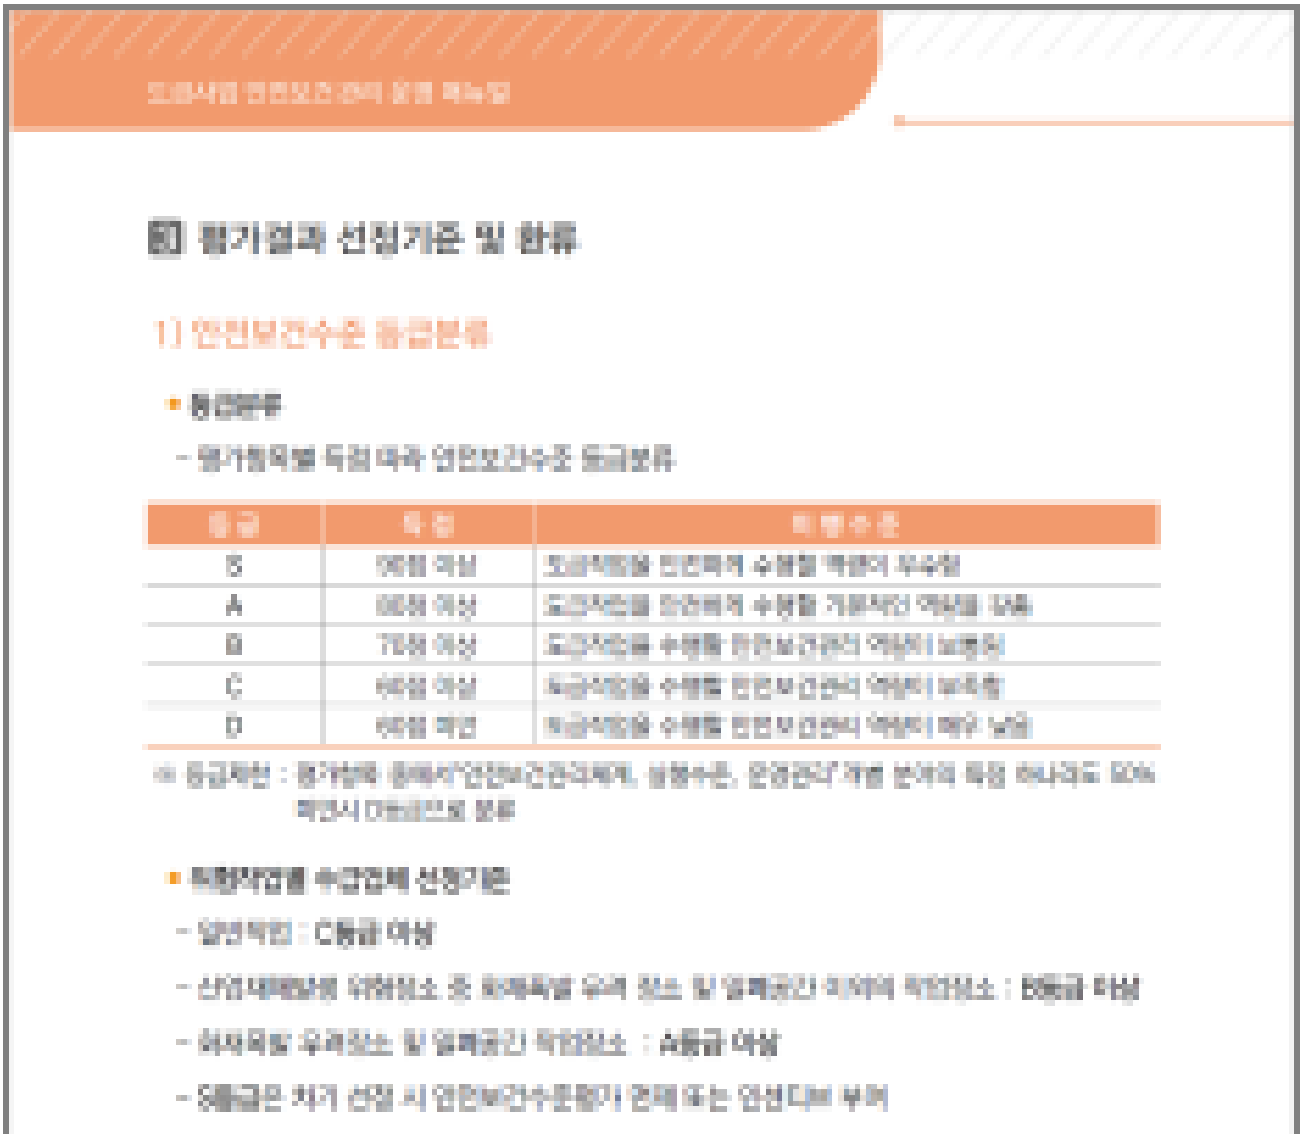

3) 평가결과 선정기준 및 분류

1) 안전보건수준 등급분류

- 등급분류
  - 평가항목별 득점 대비 안전보건수준 등급분류

등급	득점	특별수준
S	90점 이상	도급사업장 안전하게 수행할 역량이 우수함
A	80점 이상	도급사업장 안전하게 수행할 기본적인 역량을 갖춤
B	70점 이상	도급사업장 수행할 안전보건관리 역량이 보통임
C	60점 이상	도급사업장 수행할 안전보건관리 역량이 보통임
D	60점 미만	도급사업장 수행할 안전보건관리 역량이 매우 낮음

※ 등급산정 : 평가항목 중에서 안전보건관리계획, 실행수준, 안전관리 개별 분야의 득점 60점 미만시 D등급으로 분류

- 특정사업장 수급업체 선정기준
  - 일반작업 : C등급 이상
  - 산업재해발생 위험장소 중 화재폭발 우려 장소 및 질폐공간 이외의 작업장소 : B등급 이상
  - 화재폭발 우려장소 및 질폐공간 작업장소 : A등급 이상
  - D등급은 차기 선정 시 안전보건수준평가 면제 또는 인센티브 부여
